VÝKRES PRENOSNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA A ORGANIZÁCIE DOPRAVY
M 1:1000

INFORMATÍVNE ZNAČKY OSADENÉ POČAS VŠETKÝCH TROCH ETÁP REKONŠTRUKCIE MO




POZNÁMKY:


- V PRÍPADE, ŽE NAVRHOVANÉ PRENOSNÉ ZNAČENIE JE V ROZPORE S EXISTUJÚCIM TRVALÝM DZ, TOTO SA PREKRYJE PO DOBU PRÁC
- PRENOSNÉ ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY SÚ NAVRHOVANÉ V ZÁKLADNOM ROZMERE. REFLEXNEJ ÚPRAVE A NA POZNAČENIE KONŠTRUKCIE - STLPOVÝCH ČLÁNKOVÝCH ČERVENO-BIELYM ELEKOM NA OJEDINELÝCH POSTUPOCH V ZMYSLE ZÁKONA NR. SR 9/2009 PRÍLOHY NR SR 9/2009, TP 85, A STN 01 8020, STN P 6101 A ICH ZMIEN A OPRAV
- PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC NA MOSTNOM OBJEKTE JE NUTNÉ VYTYČIŤ VŠETKY JESTVUJÚCE SIETE ICH SPRÁVCAMI
- PRENOSNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE JE NAVRHOVANÉ PODĽA VZOROVÝCH SCHÉM PRE DLHODOBÉ PRACOVNÉ MIESTO V OBCI V ZMYSLE TP 08/2013 A TP 085 – ČIASTOČNÁ UZÁVERA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE S OBCHÁDZKOVÝMI TRASAMI
- DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY UMIESTNIŤ TAK, ABY NEZASAHOVALI DO PREJAZDNÉHO PROFILU KOMUNIKÁCIE (OKREM ZÁBRAN Z 2b)
- STAVEBNÉ PRÁCE BUDÚ PREBIEHAŤ POČAS DENNEJ DOBY, OSADENÉ ZNAČENIE AJ POČAS NOCI, STÁLE PRACOVNÉ MIESTO
- IHNEĎ PO REALIZÁCII STAVEBNÝCH PRÁC SA DZ DOSTRANÍ A TO PRÍSTI SMERU JAZDY!!
- STAVEBNÉ PRÁCE BUDÚ TRVAŤ PRIBLIŽNE 3-4 MESIACE

DOPRAVNÉ ZNAČENIE V MIESTE REKONŠTRUOVANÉHO MO
M 1:500

I. ETAPA
PRAVÁ STRANA MOSTA V SMERE PRIEM. ZÓNA - CENTRUM

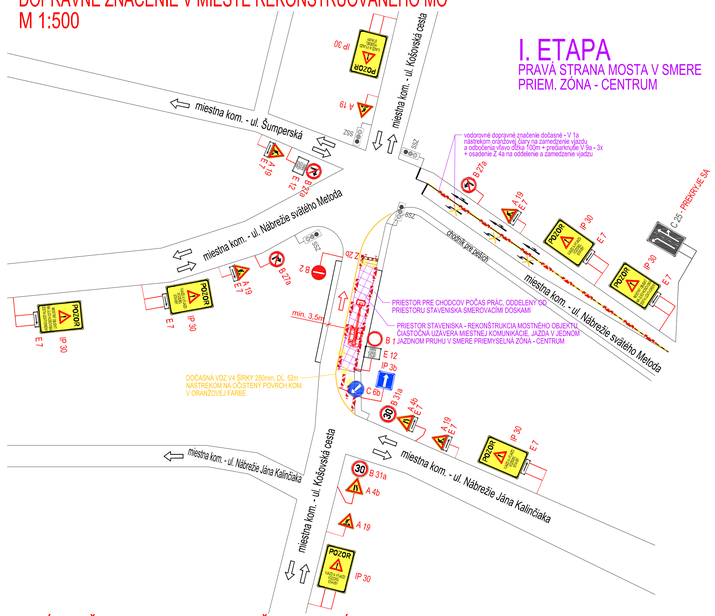


II. ETAPA
ĽAVÁ STRANA MOSTA V SMERE PRIEM. ZÓNA - CENTRUM

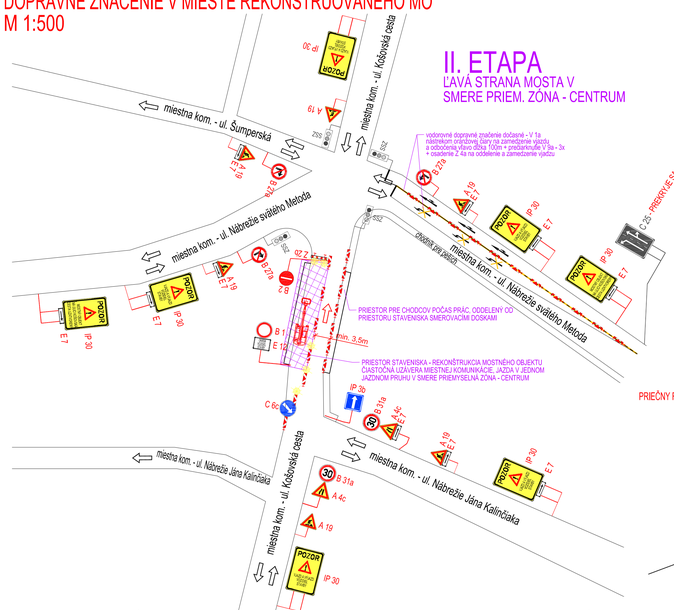

DOPRAVNÉ ZNAČENIE V MIESTE REKONŠTRUOVANÉHO MO
M 1:500

III. ETAPA
REKONŠTRUKCIA ČASTI PRE PEŠÍCH NA MOSTE

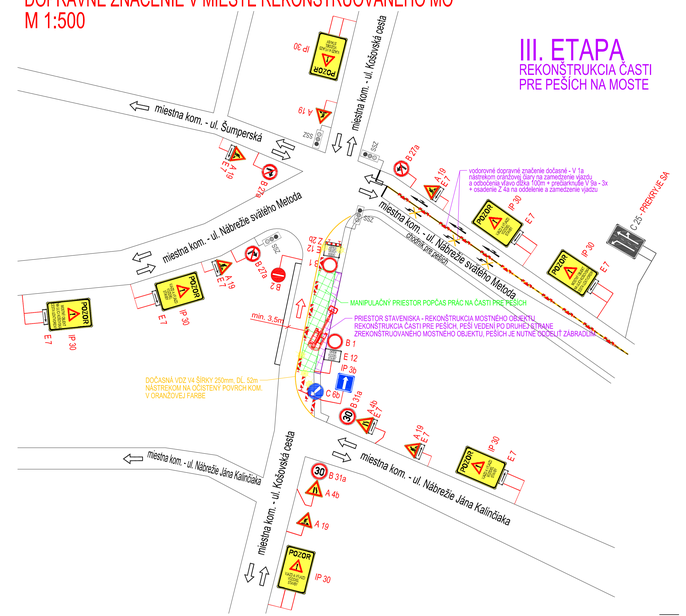

INÉ DOPRAVNÉ ZARIADENIA

Z 2b	ZÁBRANA NA OZNAČENIE UZÁVIERKY S ORANŽOVÝMI VÝSTRAŽNÝMI BLIKAJÚCIMI SVETLAMI	2 KS
Z 4a	SMEROVACIA DOSKA ĽAVÁ (OBOJSTRANNÁ)	25 KS
VS1	VÝSTRAŽNÉ BLIKACIE SVETLO TYPU 1	5 KS

VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE

V 1a	POZDĹŽNA SÚVISLÁ ČIARA	DĹ. 100m
V 4	POZDĹŽNA SÚVISLÁ VODIACA ČIARA	DĹ. 52m

PRIEČNY REZ MIESTNOU KOMUNIKÁCIOU POČAS OBMEDZENIA PREMÁVKY NA VYKONANIE STAVEBNÝCH PRÁC NA REKONŠTRUKCII MOSTNÉHO OBJEKTU NA KOŠŠOVSKEJ CESTE M 1:100



LEGENDA NAVRHOVANÉHO PRENOSNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA:

ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE

		VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY	
A 4b		ZÚŽENIE VOZOVKY SPRAVA - FLUORESCENČNÝ PODKLAD	2 KS
A 4c		ZÚŽENIE VOZOVKY ZĽAVA - FLUORESCENČNÝ PODKLAD	2 KS
A 19		PRÁCA - FLUORESCENČNÝ PODKLAD	5 KS
A 21		OBOJSMERNÁ PREMÁVKA - FLUORESCENČNÝ PODKLAD	2 KS
		ZÁKAZOVÉ ZNAČKY	
B 1		ZÁKAZ VJAZDU VŠETKÝCH VOZIDIEL V OBOCH SMEROCH	1 KS
B 2		ZÁKAZ VJAZDU VŠETKÝCH VOZIDIEL V JEDNOM SMERE	1 KS
B 6		ZÁKAZ VJAZDU NÁKLADNÝCH VOZIDIEL	1 KS
B 7		ZÁKAZ VJAZDU AUTOBUSOV	1 KS
B 27a		ZÁKAZ ODBOČOVANIA VPRAVO	3 KS
B 27b		ZÁKAZ ODBOČOVANIA VĽAVO	3 KS
B 31a	30	NAJVYŠŠIA DOVOLENÁ RÝCHLOSŤ	3 KS
		PRIKAZOVÉ ZNAČKY	
C 6c		PRIKÁZANÝ SMER JAZDY OBCHÁDZANIA VPRAVO	1 KS
C 6b		PRIKÁZANÝ SMER JAZDY OBCHÁDZANIA VĽAVO	1 KS
		INFORMATÍVNE PREVÁDZKOVÉ A SMEROVÉ ZNAČKY	
IP 3b		JEDNOSMERNÁ PREMÁVKA	1 KS
IS 2S	CENTRUM	SMEROVÁ TABUĽA NA OZNAČENIE OBCHÁDZKY	4 KS
IP 30	POZOR	ZMENA MIESTNEJ ÚPRAVY - FLUORESCENČNÝ PODKLAD 5 x text "VJAZD A VÝJAZD VOZIDIEL STAVBY" 4 x text "MOSTNÝ OBJEKT NA ULICI KOŠOVSKÁ CESTA UZATVORENÝ" 9 x text "MOSTNÝ OBJEKT NA ULICI KOŠOVSKÁ CESTA V REKONŠTRUKCII"	18 KS
		DODATKOVÉ TABUĽKY	
E 7		SMEROVÁ ŠÍPKA	9 KS
E 10		DRUH VOZIDLA	6 KS
E 12		DODATKOVÁ TABUĽKA S TEXTOM "OKREM DOPRAVNEJ OBSLUHY"	1 KS

Zodp. projektant:	HIP:	VYPRACOVAL:	TASUM GONAR Technical Assessment of Structures and Maintenance
ING. PETER SLAŠŤAN	ING. PETER SLAŠŤAN	ING. PETER VOJNÚ	
MIESTO STAVBY: PRIEVIDZA			
INVESTOR: MESTO PRIEVIDZA, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza			
STAVBA: REKONŠTRUKCIA MOSTNÉHO OBJEKTU NA KOŠOVSKEJ CESTE V PRIEVIDZI			FORMÁT: 12xA4 DÁTUM: 06/2017 Č. ZÁKAZKY: TG-008/16-P
NÁZOV PRÍLOHY: VÝKRES PRENOSNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA			MERITKO: 1:1000,500,100 ČÍSLO VÝKRESU: D.3
